

**COMPTE RENDU
DE CONTROLE
PAR
INSPECTION VIDEO
DES RESEAUX
EAUX USEES / EAUX VANNES**

SOCIETE CHAIGNEAU

**2, RUE DU TREUIL
33440 AMABRES ET LAGRAVE**

Entretien et maintenance
des réseaux d'assainissement
collectifs et autonomes

sarpsa.h2a@groupe-sarp.com » www.h2a33.fr





SIÈGE SOCIAL . 13, rue du 503^e Régiment du Train . Z.I. les Portes Océanes . 33127 Martignas-sur-Jalle
tel. 05 56 99 14 33 . sarpso.h2a@groupe-sarp.com . www.h2a33.fr

COMPTE RENDU D'INSPECTION VIDEO

Cliant : **SOCIETE CHAIGNEAU**

Commune : **AMBARES ET LAGRAVE**

Adresse : **2, rue du Treuil**

Date de début des travaux : **02 Septembre 2025**

Référence du support : **Fichier PDF et USB**

Objectif de l'inspection : **Diagnostic**

Nature des effluents : **Eaux Usées/Eaux Vannes**

Conclusion : Le contrôle par inspection vidéo du réseau d'assainissement gravitaire des eaux usées/eaux vannes n'a révélé aucune anomalie majeure.

Etabli par :

M. Thibaut DARRICHARD

Le : 09 Septembre 2025

Approuvé par :

M. Sébastien FROUSTEY

Le : 09 Septembre 2025

H2a
SARP SUD OUEST

13, rue du 503^e Régiment du Train
Z.I. les Portes Océanes
33127 Martignas-sur-Jalle
tel. 05 56 99 14 33

sarpso.h2a@groupe-sarp.com
www.sarp-habitatservices.fr

AGENCE MÉRIGNAC

4, Impasse des Saules
33700 Mérignac

SIRET 341 039 857 00550

AGENCE BORDEAUX

16, rue Maréchal Lyautey
33200 Bordeaux

AGENCES BASSIN D'ARCACHON

Agence Arcachon
4, Impasse Darmusier
33120 Arcachon

Agence Arès
16, rue des Grépins
33740 Arès

AGENCE BÈGLES

66, rue Emile Combes
33130 Bègles



Table des matières

Nom du projet : Chaigneau TP 02.09.25	N° de projet :	Responsable:	Date: 09/09/2025	N° de dossier :
---	----------------	--------------	----------------------------	-----------------

Synthèse d'inspection	1
<i>Inspection: 1</i>	
Informations du projet	4
Tronçon: 1, BREU1 --- Aval	5
Tronçon: 2, BREU2 --- Aval	7
Tronçon: 3, BREU3 --- Aval	9
Tronçon: 4, R1 --- R2	11
Tronçon: 5, R2 --- R3	13

Sommaire du réseau

Nom du projet : Chaigneau TP 02.09.25	N° du projet :	Responsable :	Date : 09/09/2025	N° de dossier :
---	----------------	---------------	-----------------------------	-----------------


Nous vous prions de trouver en annexe le rapport d'inspection
télévisée.

Longueur totale du réseau	_____	92,40 m
Longueur inspectée du réseau	_____	92,40 m
Longueur non inspectée du réseau	_____	0,00 m
Longueur totale des branchements	_____	0,00 m
Longueur inspectée des branchements	_____	0,00 m
Longueur non inspectée des branchements	_____	0,00 m
Nombre de tronçons	_____	5
Nombre de branchements	_____	0
Nombre de photos	_____	13


Synthèse d'inspection télévisée

Nom du projet: Chaigneau TP 02.09.25	N° du projet :	Responsable :	Date: 09/09/2025	N° de dossier :
--	----------------	---------------	----------------------------	-----------------


Nom du tronçon : N° d'index: : En amont: En aval :	BREU1>>Aval 1 BREU1 Aval	Longueur du tronçon : Longueur unitaire : Diamètre : Matériau :	5,40 m circulaire 160/160 mm PVC-U
---	---	--	---

Distance	Anomalies	Gravité
 BREU1 — <u>0,00</u> — BCDA Aval — <u>5,40</u> — BCAA	Noeud de départ, regard de visite BREU1 Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 160 mm, (largeur: 160 mm)	

Nom du tronçon : N° d'index: : En amont: En aval :	BREU2>>Aval 2 BREU2 Aval	Longueur du tronçon : Longueur unitaire : Diamètre : Matériau :	4,80 m PVC-U
---	---	--	---------------------------------------

Distance	Anomalies	Gravité
 BREU2 — <u>0,00</u> — BCDA Aval — <u>4,80</u> — BCEF	Noeud de départ, regard de visite BREU2 Noeud d'arrivée, raccordement important sans regard de visite Aval / Raccordement par culotte Ouverte	

Nom du tronçon : N° d'index: : En amont: En aval :	BREU3>>Aval 3 BREU3 Aval	Longueur du tronçon : Longueur unitaire : Diamètre : Matériau :	5,10 m PVC-U
---	---	--	---------------------------------------

Distance	Anomalies	Gravité
 BREU3 — <u>0,00</u> — BCDA Aval — <u>5,10</u> — BCEF	Noeud de départ, regard de visite BREU3 Noeud d'arrivée, raccordement important sans regard de visite Aval	

Synthèse d'inspection télévisée

Nom du projet: Chaigneau TP 02.09.25	N° du projet :	Responsable :	Date: 09/09/2025	N° de dossier :
--	----------------	---------------	----------------------------	-----------------

Nom du tronçon : N° d'index: : En amont: En aval :	R2>>R1 4 R1 R2	Longueur du tronçon : Longueur unitaire : Diamètre : Matériau :	58,70 m PVC-U
---	---	--	--

Distance	Anomalies	Gravité
	0,00 BCDA Noeud de départ, regard de visite R2 52,80 BCAAA Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm) 58,70 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite R1	

Nom du tronçon : N° d'index: : En amont: En aval :	R2>>R3 5 R2 R3	Longueur du tronçon : Longueur unitaire : Diamètre : Matériau :	18,40 m PVC-U
---	---	--	--

Distance	Anomalies	Gravité
	0,00 BCDA Noeud de départ, regard de visite R2 9,50 BCAAA Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm) 13,90 BCAAA Culotte, raccordement ouvert à 9 h., hauteur: 160 mm, (largeur: 160 mm) 18,40 BCEA Noeud d'arrivée, regard de visite R3	

Information du projet

Nom du projet : Chaigneau TP 02.09.25		N° du projet :		Responsable :		Date : 09/09/2025	
Maître d'ouvrage Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:				Maître d'oeuvre Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:			
Prestataire H2A SARP Sud Ouest Responsable: Entreprise M FROUSTEY Sébastien Division: Assainissement Boîte postale: 33127 Rue: 13 Rue du 503ème Régiment du train NP/Localité: MARTIGNAS SUR JALLES N° de téléphone: 05.56.99.14.33 N° de télécopie: N° de portable: E-mail:		Client Société Chaigneau Responsable: Professional Division: Boîte postale: 33510 Rue: Route de Marcheprime NP/Localité: Marcheprime N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:					
Entreprise T.P. Responsable: Division: Boîte postale: Rue: NP/Localité: N° de téléphone: N° de télécopie: N° de portable: E-mail:				L'édition de ce rapport à été réalisé avec le logiciel WinCan v8 (Gamme de logiciels spécialisés dans la collecte de données ITV pour prestataire et collectivité locale). www.wincan.fr			


Rapport d'inspection télévisée

Date: 02/09/2025		Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: privé	Norme: NF_EN_13508-2	N° d'index: 1
Longueur [m]: 5,40 m	Longueur inspectée [m]: 5,40 m	Nettoyage: oui	Précipitation: pas de précipitation		Stockage vidéo: Disque dur portable

En amont: BREU1	Direction: Dans le sens de l'écoulement	Ville/ village: 33440
En aval: Aval	Emplacement: 2, rue du Treuil	Quartier: Ambares et Lagrave
Tronçon: BREU1>>Aval		

Objet de l'inspection : Contrôle	Diamètre : circulaire 160/160 mm
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : PVC-U

Remarque :

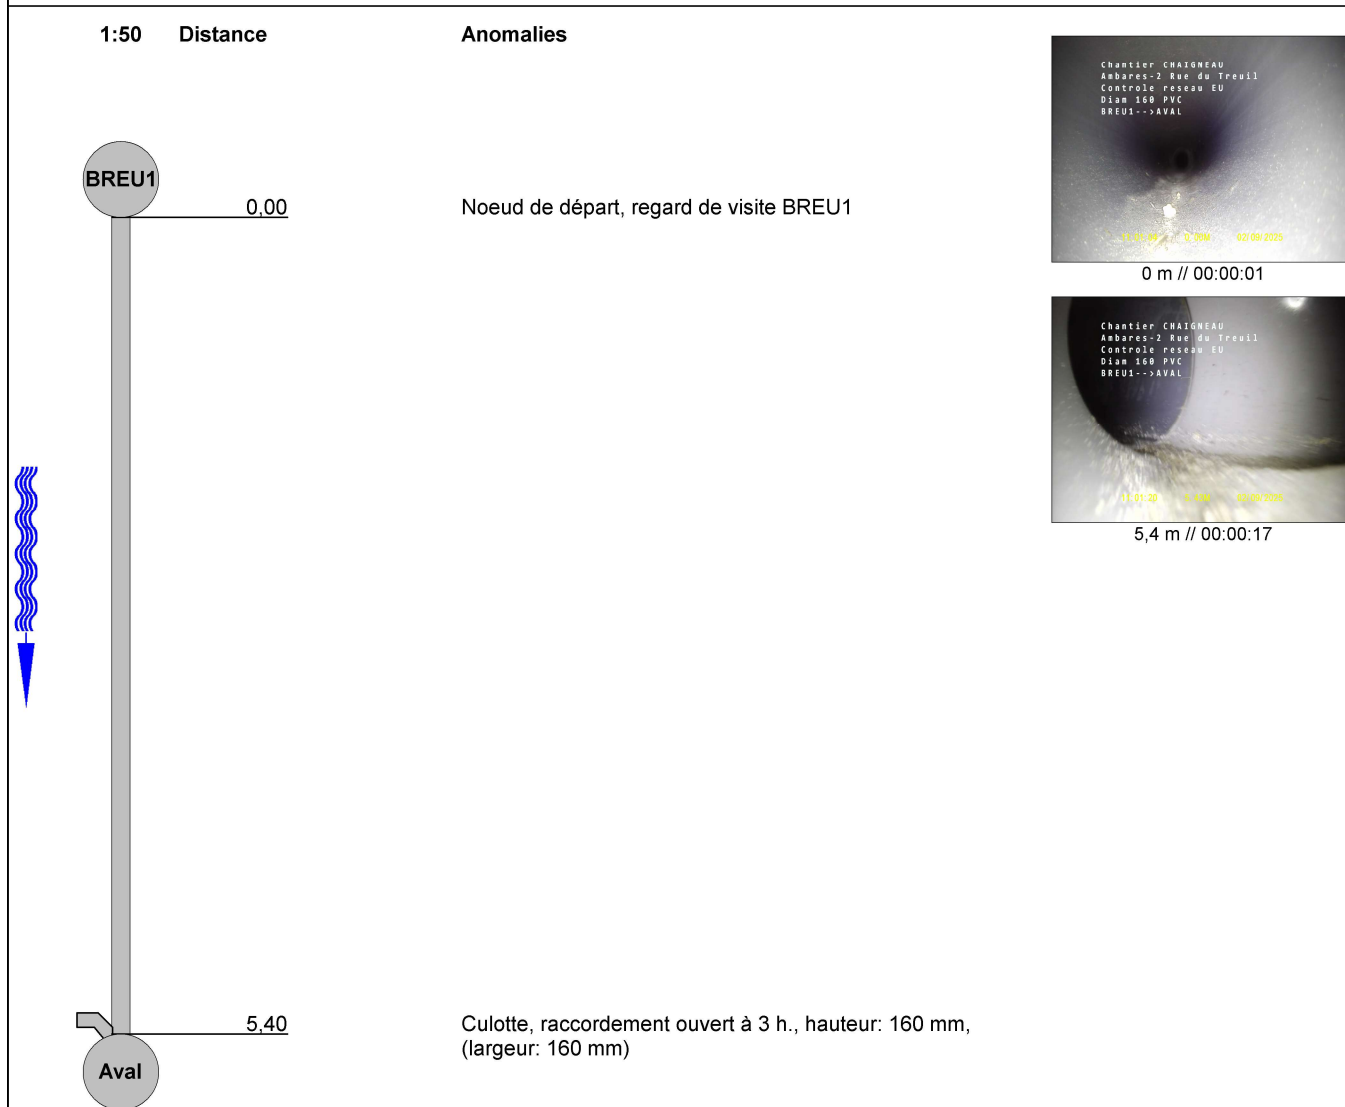

Photos de l'inspection

Ville/ village 33440	Emplacement: 2, rue du Treuil	Date : 02/09/2025	N° d'index : 1	Chantier : Ambares et Lagrave
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---



Photo: 1_1_1_A.jpg
0m, Noeud de départ, regard de visite BREU1



Photo: 1_1_2_A.jpg
5,4m, Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 160 mm, (largeur: 160 mm)


Rapport d'inspection télévisée

Date: 02/09/2025		Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: privé	Norme: NF_EN_13508-2	N° d'index: 2
Longueur [m]: 4,80 m	Longueur inspectée [m]: 4,80 m	Nettoyage: oui	Précipitation: pas de précipitation		Stockage vidéo: Disque dur portable

En amont: BREU2	Direction: Dans le sens de l'écoulement	Ville/ village: 33440
En aval: Aval	Emplacement: 2, rue du Treuil	Quartier: Ambares et Lagrave
Tronçon: BREU2>>Aval		

Objet de l'inspection : Contrôle	Diamètre :
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : PVC-U

Remarque :

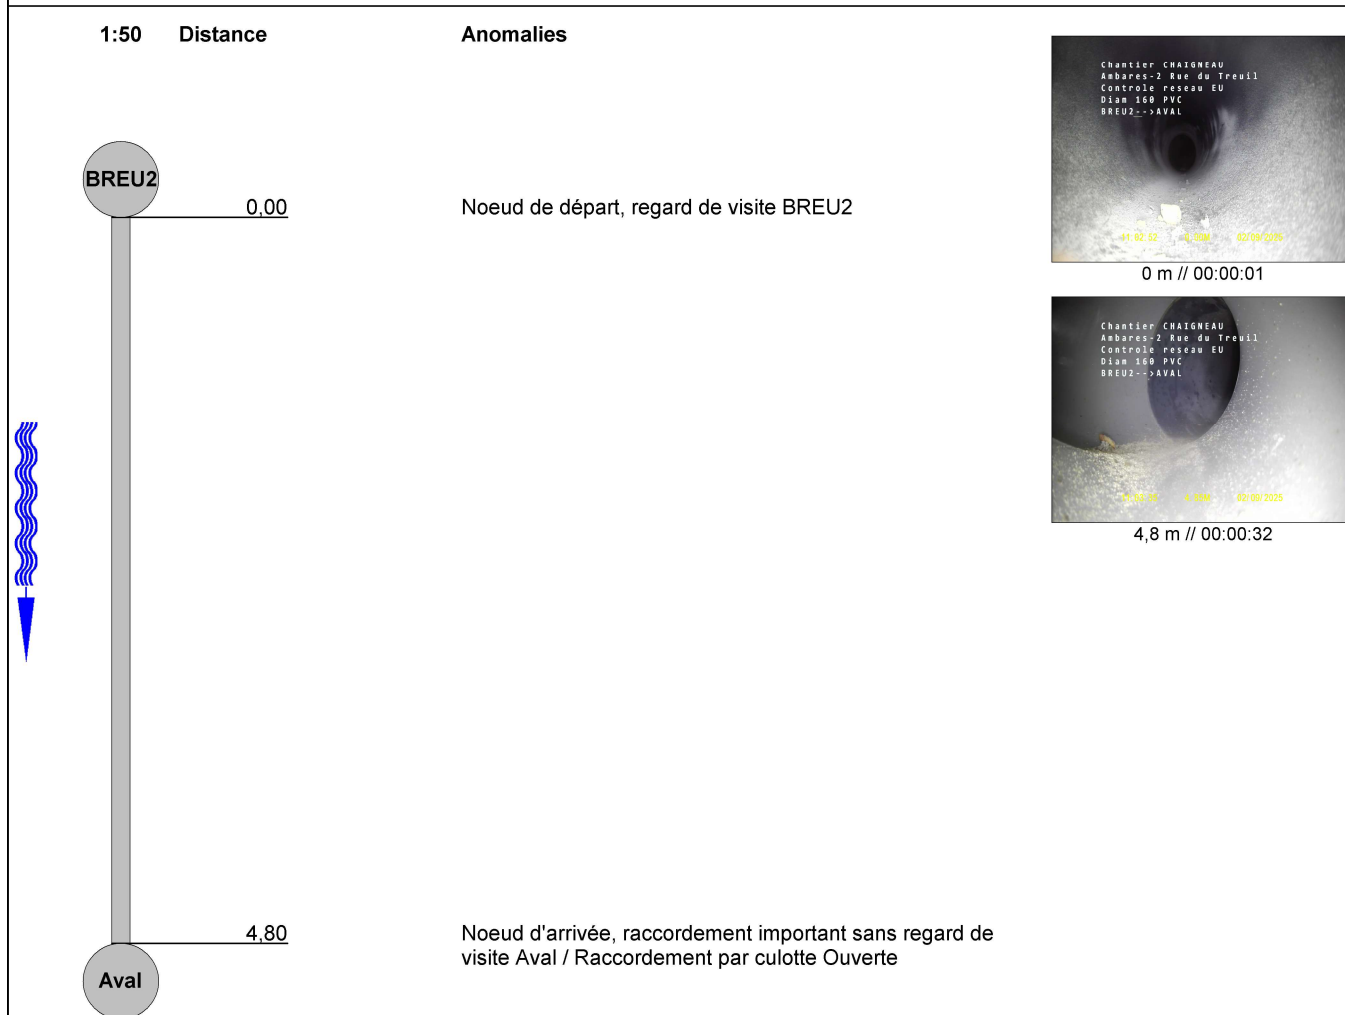

Photos de l'inspection

Ville/ village 33440	Emplacement: 2, rue du Treuil	Date : 02/09/2025	N° d'index : 2	Chantier : Ambares et Lagrave
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---



Photo: 2_2_3_A.jpg
0m, Noeud de départ, regard de visite BREU2



Photo: 2_2_4_A.jpg
4,8m, Noeud d'arrivée, raccordement important sans regard de visite Aval / Raccordement par culotte Ouverte


Rapport d'inspection télévisée

Date: 02/09/2025		Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: privé	Norme: NF_EN_13508-2	N° d'index: 3
Longueur [m]: 5,10 m	Longueur inspectée [m]: 5,10 m	Nettoyage: oui	Précipitation: pas de précipitation		Stockage vidéo: Disque dur portable

En amont: BREU3	Direction: Dans le sens de l'écoulement	Ville/ village: 33440
En aval: Aval	Emplacement: 2, rue du Treuil	Quartier: Ambares et Lagrave
Tronçon: BREU3>>Aval		

Objet de l'inspection : Contrôle	Diamètre :
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : PVC-U

Remarque :

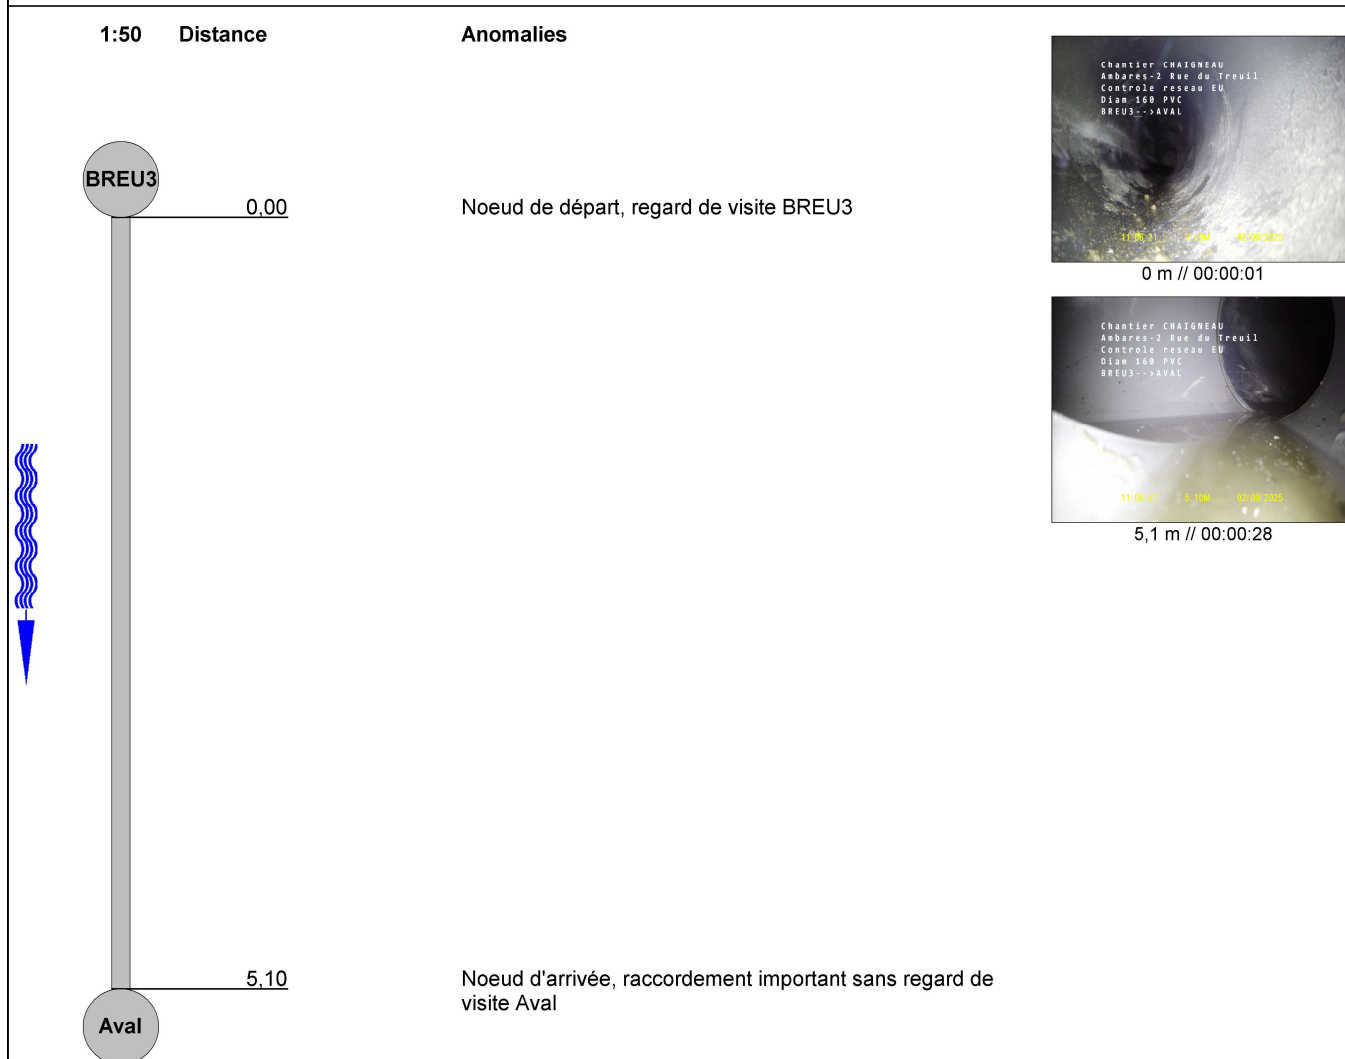

Photos de l'inspection

Ville/ village 33440	Emplacement: 2, rue du Treuil	Date : 02/09/2025	N° d'index : 3	Chantier : Ambares et Lagrave
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---

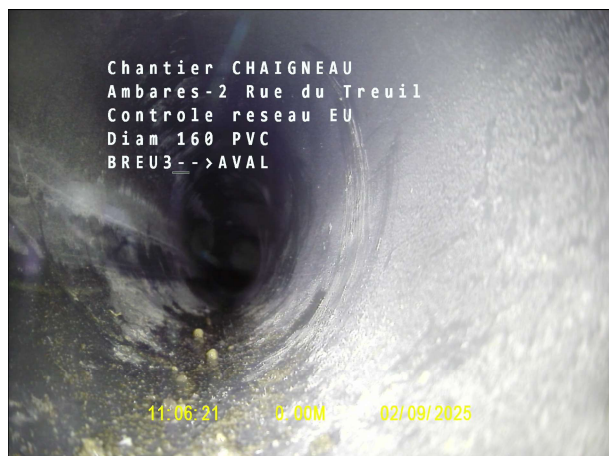


Photo: 3_3_5_A.jpg
0m, Noeud de départ, regard de visite BREU3



Photo: 3_3_6_A.jpg
5,1m, Noeud d'arrivée, raccordement important sans regard de visite Aval

Rapport d'inspection télévisée

Date: 02/09/2025		Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: privé	Norme: NF_EN_13508-2	N° d'index: 4
Longueur [m]: 58,70 m	Longueur inspectée [m]: 58,70 m	Nettoyage: oui	Précipitation: pas de précipitation		Stockage vidéo: Disque dur portable

En amont: R1	Direction: Contre le sens de l'écoulement	Ville/ village: 33440
En aval: R2	Emplacement: 2, rue du Treuil	Quartier: Ambares et Lagrave
Tronçon: R2>>R1		

Objet de l'inspection : Contrôle	Diamètre :
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : PVC-U

Remarque :

1:465 Distance

Anomalies

R2
0,00

Noeud de départ, regard de visite R2



0 m // 00:00:02



52,8 m // 00:02:47



58,7 m // 00:03:52

52,80

Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm)

58,70

Noeud d'arrivée, regard de visite R1

R1

Photos de l'inspection

Ville/ village 33440	Emplacement: 2, rue du Treuil	Date : 02/09/2025	N° d'index : 4	Chantier : Ambares et Lagrave
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---



Photo: 4_4_7_A.jpg
0m, Noeud de départ, regard de visite R2



Photo: 4_4_8_A.jpg
52,8m, Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm)

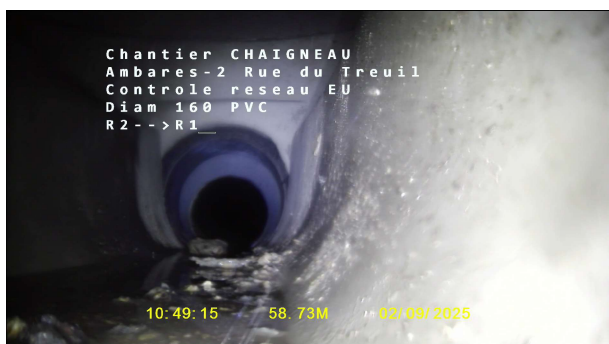


Photo: 4_4_9_A.jpg
58,7m, Noeud d'arrivée, regard de visite R1

Rapport d'inspection télévisée

Date: 02/09/2025		Température: au-dessus de zéro	Propriété foncière: privé	Norme: NF_EN_13508-2	N° d'index: 5
Longueur [m]: 18,40 m	Longueur inspectée [m]: 18,40 m	Nettoyage: oui	Précipitation: pas de précipitation		Stockage vidéo: Disque dur portable


En amont: R2	Direction: Dans le sens de l'écoulement	Ville/ village: 33440
En aval: R3	Emplacement: 2, rue du Treuil	Quartier: Ambares et Lagrave
Tronçon: R2>>R3		

Objet de l'inspection : Contrôle	Diamètre :
Méthode d'inspection : par une télécaméra circulant dans la canalisation	Matériau : PVC-U

Remarque :

1:150 Distance


Anomalies

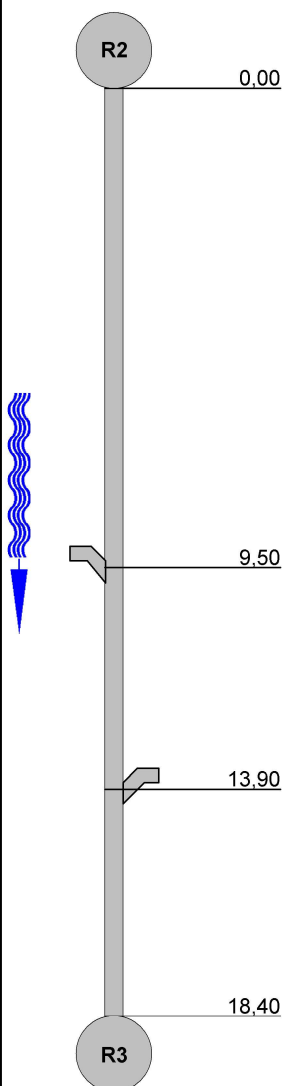

Noeud de départ, regard de visite R2



0 m // 00:00:00



9,5 m // 00:00:26



13,9 m // 00:00:37



18,4 m // 00:00:57

Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm)

Culotte, raccordement ouvert à 9 h., hauteur: 160 mm, (largeur: 160 mm)

Noeud d'arrivée, regard de visite R3

Photos de l'inspection

Ville/ village 33440	Emplacement: 2, rue du Treuil	Date : 02/09/2025	N° d'index : 5	Chantier : Ambares et Lagrave
--------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------	---



Photo: 5_5_10_A.jpg
0m, Noeud de départ, regard de visite R2

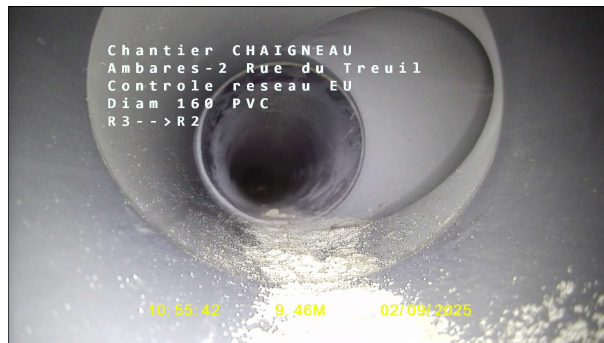


Photo: 5_5_11_A.jpg
9,5m, Culotte, raccordement ouvert à 3 h., hauteur: 100 mm, (largeur: 100 mm)



Photo: 5_5_12_A.jpg
13,9m, Culotte, raccordement ouvert à 9 h., hauteur: 160 mm, (largeur: 160 mm)

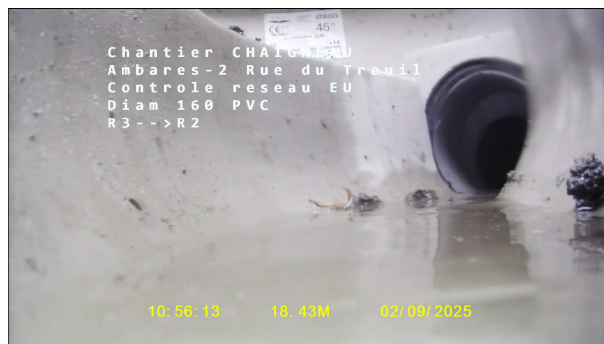


Photo: 5_5_13_A.jpg
18,4m, Noeud d'arrivée, regard de visite R3
